ETUDE EXPLORATOIRE n°26-4883

DEMANDE DU CLIENT CDF
POUR LE RACCORDEMENT
DE L'INSTALLATION DATACENTER D'UNE PUISSANCE DE 60 MW
SUR LA COMMUNE D'ANGOULEME (16)

Contacts :

Destinataire Client : Monsieur Raphael KAHAN
raphael.kahan@foncierevaillant.fr

Interlocuteur RTE : Monsieur Thierry VANHELST
Thierry.vanhelst@rte-france.com

Pour RTE
T Vanhelst
Date : 24/06/2026
Signature : *Vanhelst*

1. Préambule

1.1 Exposé de la demande :

Nom du demandeur du raccordement	Raphael KAHAN
Date de la demande	26/05/2026
Localisation du Point de Raccordement (Commune et Département)	ANGOULEME (16) Latitude : 45.63696 Longitude : 0.13179
Nature de la demande	Nouveau raccordement
Puissance de raccordement au soutirage	60 MW
Date de mise en service souhaitée	27/05/2027

1.2 Objectifs de l'étude

La présente étude exploratoire est réalisée conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence de RTE.

Cette étude simplifiée a pour objectif d'évaluer la faisabilité, le coût et le délai de mise en service du raccordement de l'installation du Client. Elle se limite à l'examen des contraintes de transit provoquées par l'installation sur le RPT (elle n'examine pas de façon exhaustive les contraintes liées aux courts-circuits, les perturbations électriques, …).

Ainsi, cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE.

A ce titre, il est précisé les points suivants :

- La consistance technique du raccordement proposé est susceptible d'être modifiée au stade de l'étude détaillée menée dans le cadre de l'éventuelle PTF. Cette consistance technique n'est donc pas garantie. Conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence, le demandeur aura la possibilité de demander la confirmation de la solution technique proposée dans la présente étude exploratoire préalablement à sa demande de PTF ; le montant du raccordement ne sera cependant pas actualisé.

- Les coûts et les délais du raccordement sont étroitement liés aux problèmes d'acceptabilité qui peuvent être rencontrés, aux mesures compensatoires qui peuvent être demandées, à la consistance et à la stabilité du sous-sol, etc. En conséquence, les coûts et délais mentionnés ne peuvent apporter qu'une indication au stade des études sommaires réalisées.

- Enfin, la présente étude de raccordement au RPT suppose la création par le Client d'un poste de livraison HTB. Les travaux à réaliser en aval de la limite de propriété sont de la responsabilité et à la charge du Client et ne sont pas mentionnés dans cette étude.

1.3 Hypothèses de l'étude

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet du Client sont les suivantes :

- Les Propositions Techniques et Financières acceptées à la date de demande de l'étude ;
- Le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour lesquelles les travaux sont démarrés ou dont la mise en service est compatible avec la mise en service souhaitée du raccordement ;
- Les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l'échéance prévue de mise en service de l'installation du Client ;
- L'étude de transit est réalisée à partir de points horaires représentatifs des conditions de consommation d'une année ;
- Les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de l'année 2026 ;
- Le point de raccordement pris en compte est celui figurant dans la fiche D1 fournie par le Client lors de sa demande.

Nota :

- L'emplacement du point de raccordement envisagé et sa distance par rapport aux ouvrages existants du RPT conditionne fortement le coût de réalisation du raccordement ;
- L'arrivée d'autres installations de production et de consommation dans la zone d'étude serait de nature à remettre en cause les résultats de cette étude exploratoire.

2. Solutions de raccordement HTB

Schéma électrique de la zone d'étude et localisation de l'Installation du point de raccordement



Domaine de tension de référence

Comme défini dans l'article 105 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

Domaine de tension de raccordement de référence	Puissance de raccordement de l'installation P_{rac} inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)	
HTA	40	100/d
HTB1 (63 kV et 90 kV)	100	1 000/d
HTB2 (150 kV et 225 kV)	400	10 000/d
Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport		

La distance « d » entre le projet du client et le poste RTE 225/90 kV de FLEAC a été estimée à 10 km (tracé considéré comme étant le plus réaliste techniquement et administrativement).

Pour la puissance de raccordement demandée de 60 MW, la tension de raccordement de référence est la HTB1 (90 kV).


Contribution financière du Client

Les principes d'établissement de la contribution du Client sont les suivants :

- Le Client prend en charge :
  - 70 % des coûts des études et des travaux d'extension strictement nécessaires au raccordement du Client,
  - 100 % des coûts des études et des travaux supplémentaires demandés par le Client (ex : alimentation complémentaire ou de secours) ;
- RTE prend en charge le reste (30 % extension, 100 % renforcement).

2.1 Solution étudiée : Raccordement en antenne sur le poste de RABION 90 kV

Schéma de raccordement de principe

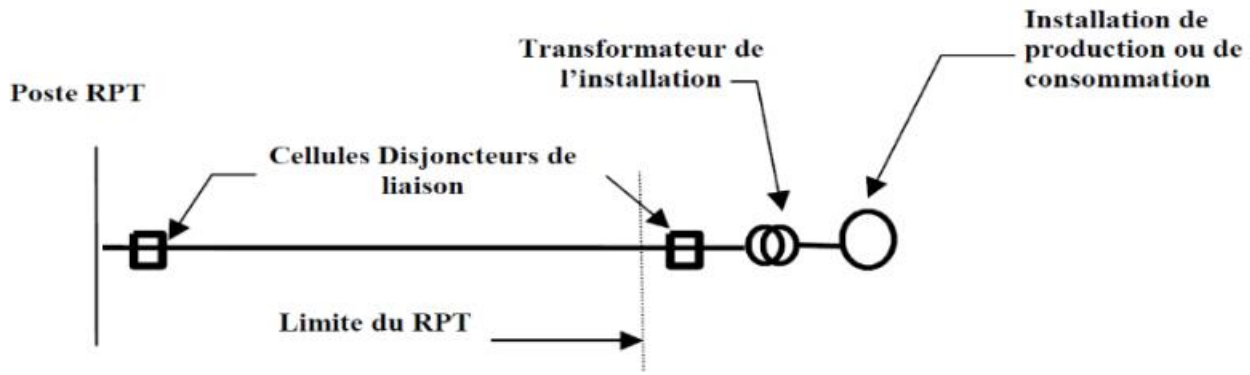

Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	90 kV
Stratégie de raccordement	En antenne sur le poste de RABION 90 kV moyennant une liaison souterraine.
Impact du raccordement sur le RPT	Le raccordement de 60 MW sur le poste de Rabion renforce une contrainte existante sur la ligne Rabion-Vallade 90 kV et en génére une nouvelle sur la ligne Fléac-Rabion n°2 90 kV. RTE a déjà pris une décision d'engager des travaux pour solution les contraintes existantes sur la ligne Rabion-Vallade 90 kV. Ces travaux sont prévus d'être réalisés pour 2031. Ces travaux sont pris en charge par RTE.
Consistance des travaux : - Travaux des ouvrages du périmètre d'extension **dédiés** au raccordement du Client	Description des travaux dans le périmètre d'extension **Pour l'alimentation principale** - Création d'une cellule 90 kV au poste de Rabion - Création d'une liaison souterraine de 0,5 km environ et de section 1200 mm² Alu entre le poste Rabion et le point de raccordement **Pour les travaux nécessaires à la résorption des contraintes** - Renforcement de la ligne 90 kV Fléac-Rabion n°2 : la nature des travaux (retente des conducteurs ou remplacement) sera définie à l'issue des études détaillés qui seront réalisées au moment de la PTF.
Coût du Raccordement (Coût hors taxes)	Coût du raccordement : **4,5 M€** Contribution du client : **3,15 M€**
Nota relatif au coût	Le coût est susceptible d'évoluer en fonction de la nature des travaux nécessaire au renforcement de la ligne 90 kV Fléac-Rabion n°2.
Délai de raccordement	61 mois à compter de la date d'acceptation de la PTF. Le délai de raccordement sera affiné au stade PTF. Des pistes d'optimisation pourront être recherchées sur les délais d'approvisionnement via l'anticipation de la commande de certains matériels, sous réserve de faisabilité et de garantie financière par le Client. Les travaux sur le ligne Rabion-Vallade 90 kV devront être terminés (échéance 2031) pour permettre le soutirage des 60 MW du data center.

3. Nota et Points d'attention

3.1 Nota en lien avec le coût du raccordement et la consistance technique

L'étude ne prend pas en compte les éventuelles contraintes de tension et de court-circuit y compris les éventuels moyens de compensation de réactif qui pourraient être nécessaires au raccordement de l'installation du Client. Les contraintes de tensions feront l'objet d'études approfondies en cas de demande de PTF, le coût du raccordement pourrait être augmenté si des moyens de compensation s'avéraient nécessaires.

3.2 Nota en lien avec les démarches administratives et leur impact sur le délai

- **Saisine de la Commission Nationale du Débat Public**

  En application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité. En conséquence, si le projet du client est soumis à une saisine de la CNDP, en application des articles L. 121-8 et de la nomenclature figurant à l'article R.121-2 du code de l'environnement, RTE devra co-saisir la CNDP en tant que co-maître d'ouvrage et accompagner le Client dans la mise en œuvre de la décision de la Commission.

  Le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure. Si RTE devait procéder à une co-saisine de la CNDP et mettre en œuvre une procédure de concertation préalable ou de débat public consécutivement à cette saisine, le délai de raccordement serait revu en conséquence.

- **Evaluation environnementale :**

  - **Cas 1 - Si Raccordement en LS** : **le projet de raccordement n'est pas soumis à évaluation environnementale**

    Le projet de raccordement n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Aussi, le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure administrative.

    Néanmoins, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité.

    En conséquence, si l'Installation est soumise à évaluation environnementale, le « projet » est, dans sa globalité, soumis à une évaluation environnementale commune et à une enquête publique commune dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'Installation.

    Le délai de raccordement sera modifié en conséquence pour prendre en compte la réalisation de ces procédures administratives qui imposent par ailleurs une coordination importante avec le Demandeur du raccordement en amont (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …) »

  - **Dans tous les cas,** il y a lieu de tenir compte de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application n° 2016-1110 du 11 août 2016, lesquels sont entrées en vigueur, s'agissant des projets soumis à évaluation environnementale systématique, le 16 mai 2017 :
    - Donc le projet dans son ensemble (Installation du Client + poste Client + liaison de raccordement au RPT) est soumis à évaluation environnementale commune, et à enquête publique dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'installation ;
    - Cette ordonnance impose une coordination importante dès la phase administrative avec le Client (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …).
    - La concertation et l'instruction administrative des projets de construction d'ouvrages du réseau de transport sont détaillées à titre indicatif dans le planning en annexe 1.

3.3 Informations générales

Informations générales en vue d'une demande de Proposition Technique et Financière

L'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence (Procédure de Raccordement) prévoit qu'une demande de PTF est accompagnée du versement par le Demandeur à RTE d'une somme forfaitaire, dont le montant est de 42 000 € HT.

Ce montant sera à déduire de la première échéance de la PTF versée par le Client à son acceptation.

Ce montant peut être remboursé dans les conditions prévues à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de référence et reprises ci-après :

« *Rétractation du demandeur*

Le Demandeur dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de l'information par RTE que la demande est complète pour se rétracter. Dans ce cas le Demandeur signifie sa volonté d'abandon de sa demande par courriel à l'adresse utilisée pour sa demande (rte-fcent-dpraccordement@rte-france.com ou rte-fcent-raccordement-conso-dist @rte-france.com). Dans ce cas un remboursement de la somme forfaitaire sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Conditions et modalités de remboursement de la somme forfaitaire une fois le délai de rétractation expiré

***En cas d'abandon du projet par le Demandeur avant acceptation de l'offre de PTF, ou d'absence d'acceptation de l'offre de PTF** : la somme forfaitaire n'est pas remboursée sauf lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :*

- Le coût du raccordement proposé dans l'offre de PTF est supérieur de plus de 30% au coût indicatif mentionné dans l'étude exploratoire, ou le cas échéant dans la reponse à la confirmation de l'étude exploratoire ;

- Le délai écoulé entre la remise de l'étude exploratoire ou la réponse à la confirmation de la solution de raccordement par RTE, et celui du dépôt de la demande de PTF par le Demandeur, n'excède pas 7 jours calendaires.

Le remboursement de la somme forfaitaire le cas échéant sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Une fois l'offre de PTF acceptée par le Demandeur :

- La somme forfaitaire est déduite du premier acompte dans les conditions prévues par les conditions générales de la PTF. Si la PTF est sans création d'actifs, la somme forfaitaire est également remboursée au Demandeur ;
- Les modalités de traitement de la somme forfaitaire en cas de résiliation de la PTF par le Client sont prévues par les conditions générales de la PTF. »

4. Conclusion


La solution de raccordement proposée est exposée ci-après

Solution(s) de raccordement	Cout à la charge du Client	Délai de raccordement après acceptation PTF
Alimentation en antenne souterraine depuis le poste de Rabion 90 kV.	3,15 M€	61 mois

Conformément à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence, la présente étude exploratoire peut être suivie d'une demande de confirmation de la solution de raccordement.

Attention, il est rappelé que l'étude exploratoire est une étude non engageante de la part de RTE. Si le client souhaite poursuivre l'instruction de son raccordement, il doit le faire via une demande de PTF.

ANNEXE : planning administratif de principe

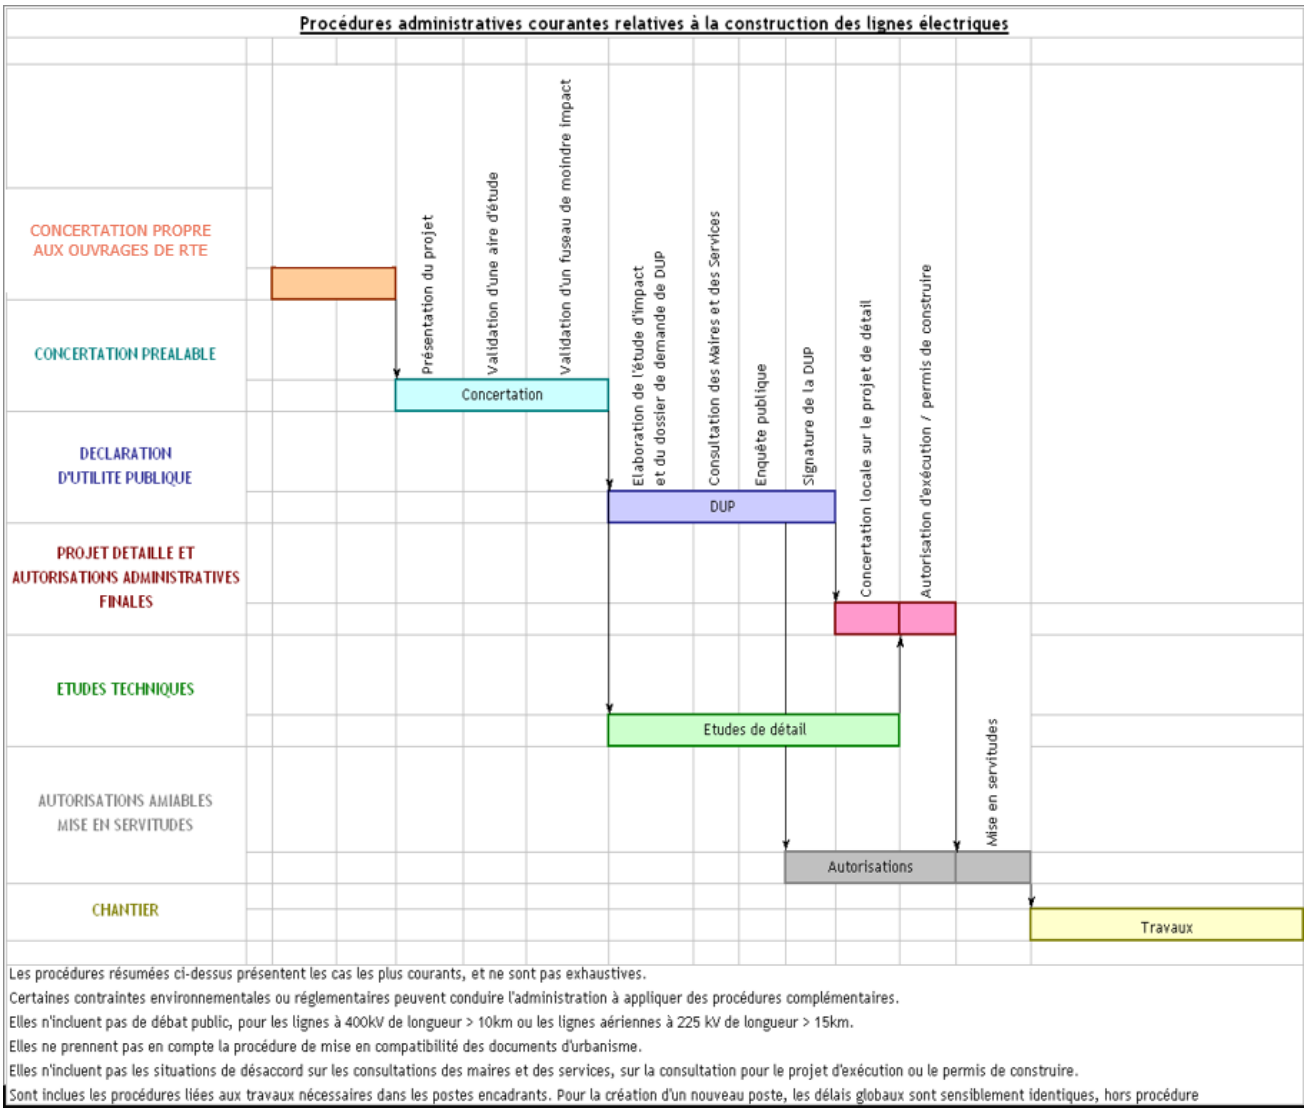

FIN DU DOCUMENT
