ETUDE EXPLORATOIRE n°26-2818

DEMANDE DU CLIENT DIGITAL2060
POUR LE RACCORDEMENT
D'UN DATACENTER D'UNE PUISSANCE DE 600 MW - 1000 MW
SUR LA COMMUNE D'OURSEL-MAISON (60)

Contacts :

Destinataire Client : Monsieur TUREDI Okan – Société DIGITAL2060
okan.turedi@digital2060.com

Interlocuteur RTE : Monsieur RUFFIN Sébastien
sebastien.ruffin@rte-france.com

Pour RTE

Date :

Signature : BONNARD Olivier

Signature numérique de BONNARD Olivier
Date : 2026.05.15 16:23:17 +02'00'

1. Préambule

1.1 Exposé de la demande :

Nom du demandeur du raccordement	DIGITAL2060
Date de la demande (le cas échéant : date initiale et date de mise à jour de la fiche D1)	17/03/2026
Localisation du Point de Raccordement (Commune et Département)	Oursel-Maison (60)
Nature de la demande	Nouveau raccordement
Puissance de raccordement au soutirage	600 MW – 1000 MW
Date de mise en service souhaitée	31/12/2031

1.2 Objectifs de l'étude

La présente étude exploratoire est réalisée conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence de RTE.

Cette étude simplifiée a pour objectif d'évaluer la faisabilité, le coût et le délai de mise en service du raccordement de l'installation du Client. Elle se limite à l'examen des contraintes de transit provoquées par l'installation sur le RPT (elle n'examine pas de façon exhaustive les contraintes liées aux courts-circuits, les perturbations électriques, …).

Ainsi, cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE.

A ce titre, il est précisé les points suivants :

- La consistance technique du raccordement proposé est susceptible d'être modifiée au stade de l'étude détaillée menée dans le cadre de l'éventuelle PTF. Cette consistance technique n'est donc pas garantie. Conformément aux dispositions de l'article 1.2.2 de la documentation technique de référence, le demandeur aura la possibilité de demander la confirmation de la solution technique proposée dans la présente étude exploratoire préalablement à sa demande de PTF ; le montant du raccordement ne sera cependant pas actualisé.

- Les coûts et les délais du raccordement sont étroitement liés aux problèmes d'acceptabilité qui peuvent être rencontrés, aux mesures compensatoires qui peuvent être demandées, à la consistance et à la stabilité du sous-sol, etc. En conséquence, les coûts et délais mentionnés ne peuvent apporter qu'une indication au stade des études sommaires réalisées.

- Enfin, la présente étude de raccordement au RPT suppose la création par le Client d'un poste de livraison HTB. Les travaux à réaliser en aval de la limite de propriété sont de la responsabilité et à la charge du Client et ne sont pas mentionnés dans cette étude.

1.3 Hypothèses de l'étude

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet du Client sont les suivantes :


- Les Propositions Techniques et Financières acceptées à la date de demande de l'étude ;
- Le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour lesquelles les travaux sont démarrés ou dont la mise en service est compatible avec la mise en service souhaitée du raccordement ;
- Les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l'échéance prévue de mise en service de l'installation du Client ;
- L'étude de transit est réalisée à partir de points horaires représentatifs des conditions de consommation d'une année ;
- Les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de l'année 2026 ;
- Le point de raccordement pris en compte est celui figurant dans la fiche D1 fournie par le Client lors de sa demande.

Nota :

- L'emplacement du point de raccordement envisagé et sa distance par rapport aux ouvrages existants du RPT conditionne fortement le coût de réalisation du raccordement ;
- L'arrivée d'autres installations de production et de consommation dans la zone d'étude serait de nature à remettre en cause les résultats de cette étude exploratoire.

2. Solutions de raccordement HTB

Schéma électrique de la zone d'étude et localisation de l'Installation du point de raccordement

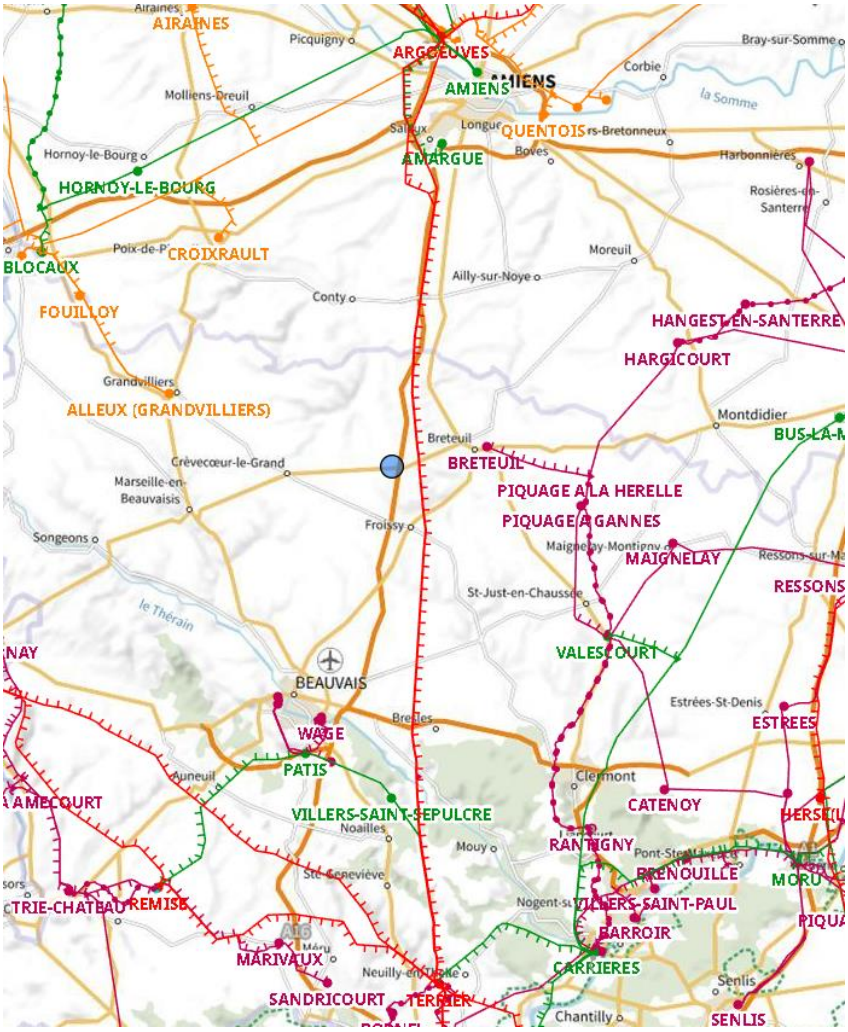

Domaine de tension de référence

Comme défini dans l'article 105 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité, le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

Domaine de tension de raccordement de référence	Puissance de raccordement de l'installation P_{rac} inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)	
HTA	40	100/d
HTB1 (63 kV et 90 kV)	100	1 000/d
HTB2 (150 kV et 225 kV)	400	10 000/d
Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport		

Pour les puissances de raccordement demandées de 600 MW et 1000 MW, la tension de raccordement de référence est la HTB3 (400 kV).


Contribution financière du Client

Les principes d'établissement de la contribution du Client sont les suivants :

- Le Client prend en charge :
  - 70 % des coûts des études et des travaux d'extension strictement nécessaires au raccordement du Client,
  - 100 % des coûts des études et des travaux supplémentaires demandés par le Client (ex : alimentation complémentaire ou de secours) ;
- RTE prend en charge le reste (30 % extension, 100 % renforcement).

2.1 Solution : Raccordement en double entrée en coupure sur les lignes 400 kV Argœuves – Terrier n° 1 et n° 2

Schéma de raccordement de principe d'une double coupure sur une liaison double

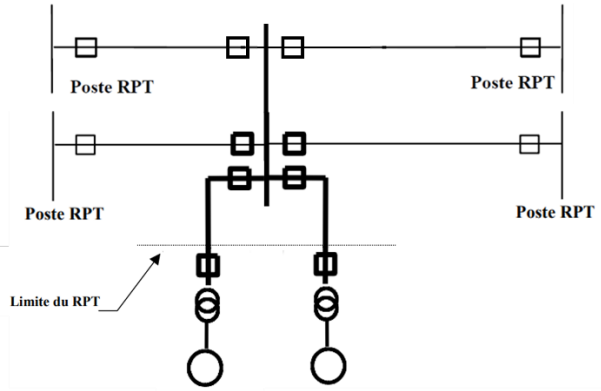

Description de la solution de raccordement

Tension de raccordement	400 kV
Stratégie de raccordement	Raccordement en double entrée en coupure sur les lignes 400 kV Argœuves – Terrier n° 1 et n° 2 moyennant la création d'un nouveau poste et de deux liaisons aériennes 400 kV entre ce poste et le point de raccordement
Impact du raccordement sur le RPT	Le raccordement aggrave des contraintes présentes sur le réseau 400 kV, des travaux de renforcement devront être réalisés.
Consistance des travaux : - Travaux des ouvrages du périmètre d'extension **dédiés** au raccordement du Client - Le cas échéant, des travaux d'adaptation du réseau existant (ouvrages **non dédiés** du RPT Réseau Public de Transport)	- Création d'un poste en double entrée en coupure sur les lignes 400 kV Argœuves-Terrier n° 1 et n° 2 comprenant six cellules lignes (quatre pour le raccordement sur les lignes 400 kV, une pour l'alimentation principale, une pour l'alimentation de secours). - Création d'une liaison aérienne double terne 400 kV en faisceau double 2 x AM 570 d'environ 2,3 km entre le nouveau poste et le point de raccordement.

Travaux de renforcement des ouvrages non dédiés du RPT (Réseau Public de Transport) et hors du périmètre d'extension du Client	Des travaux de renforcement du réseau 400 kV sont nécessaires pour résoudre les contraintes 400 kV. Ils sont pris en charge par RTE.
Installation soumise à des limitations temporaires	Dans l'attente de la réalisation des travaux de renforcement évoqués ci-dessus, RTE introduit des limitations temporaires de l'alimentation du Client jusqu'en 2035 de l'ordre de 2800 h/an pour la puissance 600 MW et de l'ordre de 2900 h/an pour la puissance 1000 MW, à la charge du Client. La profondeur, la durée et les conditions de mise en œuvre de ces limitations seront précisées en phase PTF. Elles ne seront pas indemnisées par RTE.
Coût du Raccordement (Coût hors taxes)	Coût du raccordement : **44 800 k€** Contribution du client : **38 100 k€**
Nota relatif au coût	L'emplacement envisagé pour le nouveau poste et le tracé potentiel du raccordement seront affinés au stade PTF. Les modalités de réalisation des travaux commenceront à être étudiées et pourront montrer la nécessité d'utiliser des moyens spéciaux (en particulier pour le franchissement de l'autoroute A16). Ces différents points pourraient entraîner des surcoûts non identifiés dans la présente étude exploratoire.
Délai de raccordement	**120 mois** à compter de la date d'acceptation de la PTF
Nota relatif au délai	Le délai de raccordement sera affiné au stade PTF. La fourniture d'une surface foncière par le client sera un facteur de sécurisation du projet. Par ailleurs, des pistes d'optimisation pourront être recherchées sur les délais d'approvisionnement via l'anticipation de la commande de certains matériels, sous réserve de faisabilité et de garantie financière par le Client.
Autres Points	La solution nécessitera la création d'un nouveau poste et d'une liaison aérienne double terne 400 kV. L'acceptabilité de ces ouvrages pourra impacter le délai du raccordement ou le coût, notamment en cas de nécessité de réaliser des liaisons souterraines.

3. Nota et Points d'attention

3.1 Nota en lien avec le coût du raccordement et la consistance technique

L'étude ne prend pas en compte les éventuelles contraintes de tension et de court-circuit y compris les éventuels moyens de compensation de réactif qui pourraient être nécessaires au raccordement de l'installation du Client. Les contraintes de tensions feront l'objet d'études approfondies en cas de demande de PTF, le coût du raccordement pourrait être augmenté si des moyens de compensation s'avéraient nécessaires ;

Le raccordement pourrait nécessiter la création de voies de transmission (fibre optique installée entre les postes du réseau). Cependant ce besoin n'a pas été évalué au stade de l'étude exploratoire et sera à analyser lors de la demande de PTF.

3.2 Nota en lien avec les démarches administratives et leur impact sur le délai

- **Saisine de la Commission Nationale du Débat Public**

  En application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité. En conséquence, si le projet du client est soumis à une saisine de la CNDP, en application des articles L. 121-8 et de la nomenclature figurant à l'article R.121-2 du code de l'environnement, RTE devra co-saisir la CNDP en tant que co-maître d'ouvrage et accompagner le Client dans la mise en œuvre de la décision de la Commission.

  Le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de cette procédure. Si RTE devait procéder à une co-saisine de la CNDP et mettre en œuvre une procédure de concertation préalable ou de débat public consécutivement à cette saisine, le délai de raccordement serait revu en conséquence.

- **Evaluation environnementale :**

  - **Raccordement en LA d'une longueur inférieure à 15 km ou LA HTB1 d'une longueur supérieure à 15 km : le projet de raccordement est soumis à saisine de l'autorité environnementale au cas par cas**

    Le projet de raccordement est soumis à une procédure dite de « cas par cas » consistant à saisir l'autorité environnementale en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour définir si le projet de raccordement est soumis ou non à étude d'impact.

    Néanmoins, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'ouvrage de raccordement constitue avec l'Installation un même « projet » et doit être appréhendé dans sa globalité.

    En conséquence, si l'une des composantes du projet est soumise à évaluation environnementale, le « projet » est, dans sa globalité, soumis à une évaluation environnementale commune et à une enquête publique commune dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'Installation.

    Le délai de raccordement proposé par RTE ne prend pas en compte la réalisation de ces procédures administratives qui imposent par ailleurs une coordination importante avec le Demandeur du raccordement en amont (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …) ».

  - **Dans tous les cas,** il y a lieu de tenir compte de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application n° 2016-1110 du 11 août 2016, lesquels sont entrées en vigueur, s'agissant des projets soumis à évaluation environnementale systématique, le 16 mai 2017 :
    - Donc le projet dans son ensemble (Installation du Client + poste Client + liaison de raccordement au RPT) est soumis à évaluation environnementale commune, et à enquête publique dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'installation ;
    - Cette ordonnance impose une coordination importante dès la phase administrative avec le Client (élaboration commune de l'étude d'impact, calage du dépôt des différents dossiers relatifs aux autorisations …).

- La concertation et l'instruction administrative des projets de construction d'ouvrages du réseau de transport sont détaillées à titre indicatif dans le planning en annexe 1.

3.3 Informations générales

Informations générales en vue d'une demande de Proposition Technique et Financière

L'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence (Procédure de Raccordement) prévoit qu'une demande de PTF est accompagnée du versement par le Demandeur à RTE d'une somme forfaitaire, dont le montant est de 42 000 € HT.

Ce montant sera à déduire de la première échéance de la PTF versée par le Client à son acceptation.

Ce montant peut être remboursé dans les conditions prévues à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de référence et reprises ci-après :

« *Rétractation du demandeur*

Le Demandeur dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de l'information par RTE que la demande est complète pour se rétracter. Dans ce cas le Demandeur signifie sa volonté d'abandon de sa demande par courriel à l'adresse utilisée pour sa demande (rte-fcent-dpraccordement@rte-france.com ou rte-fcent-raccordement-conso-dist @rte-france.com). Dans ce cas un remboursement de la somme forfaitaire sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Conditions et modalités de remboursement de la somme forfaitaire une fois le délai de rétractation expiré

***En cas d'abandon du projet par le Demandeur avant acceptation de l'offre de PTF, ou d'absence d'acceptation de l'offre de PTF** : la somme forfaitaire n'est pas remboursée sauf lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :*

- Le coût du raccordement proposé dans l'offre de PTF est supérieur de plus de 30% au coût indicatif mentionné dans l'étude exploratoire, ou le cas échéant dans la réponse à la confirmation de l'étude exploratoire ;

- Le délai écoulé entre la remise de l'étude exploratoire ou la réponse à la confirmation de la solution de raccordement par RTE, et celui du dépôt de la demande de PTF par le Demandeur, n'excède pas 7 jours calendaires.

Le remboursement de la somme forfaitaire le cas échéant sera effectué par virement aux coordonnées bancaires fournies par le Demandeur.

Une fois l'offre de PTF acceptée par le Demandeur :

- La somme forfaitaire est déduite du premier acompte dans les conditions prévues par les conditions générales de la PTF. Si la PTF est sans création d'actifs, la somme forfaitaire est également remboursée au Demandeur ;
- Les modalités de traitement de la somme forfaitaire en cas de résiliation de la PTF par le Client sont prévues par les conditions générales de la PTF. »

4. Conclusion

La solution de raccordement proposée est exposée ci-après :


Solution de raccordement	Cout à la charge du Client	Délai de raccordement après acceptation PTF
Raccordement en double entrée en coupure sur les lignes 400 kV Argœuves – Terrier n° 1 et n° 2 moyennant la création d'un nouveau poste et de deux liaisons aériennes 400 kV entre ce poste et le point de raccordement	**38 100 k€**	**120 mois**

Dans l'attente de la réalisation des travaux de renforcement évoqués ci-dessus, RTE introduit des limitations temporaires de l'alimentation du Client jusqu'en 2035 de l'ordre de 2800 h/an pour la puissance 600 MW et de l'ordre de 2900 h/an pour la puissance 1000 MW, à la charge du Client. La profondeur, la durée et les conditions de mise en œuvre de ces limitations seront précisées en phase PTF. Elles ne seront pas indemnisées par RTE.

Conformément à l'article 1.2.2 de la Documentation Technique de Référence, la présente étude exploratoire peut être suivie d'une demande de confirmation de la solution de raccordement.

Attention, il est rappelé que l'étude exploratoire est une étude non engageante de la part de RTE. Si le client souhaite poursuivre l'instruction de son raccordement, il doit le faire via une demande de PTF.

ANNEXE : planning administratif de principe

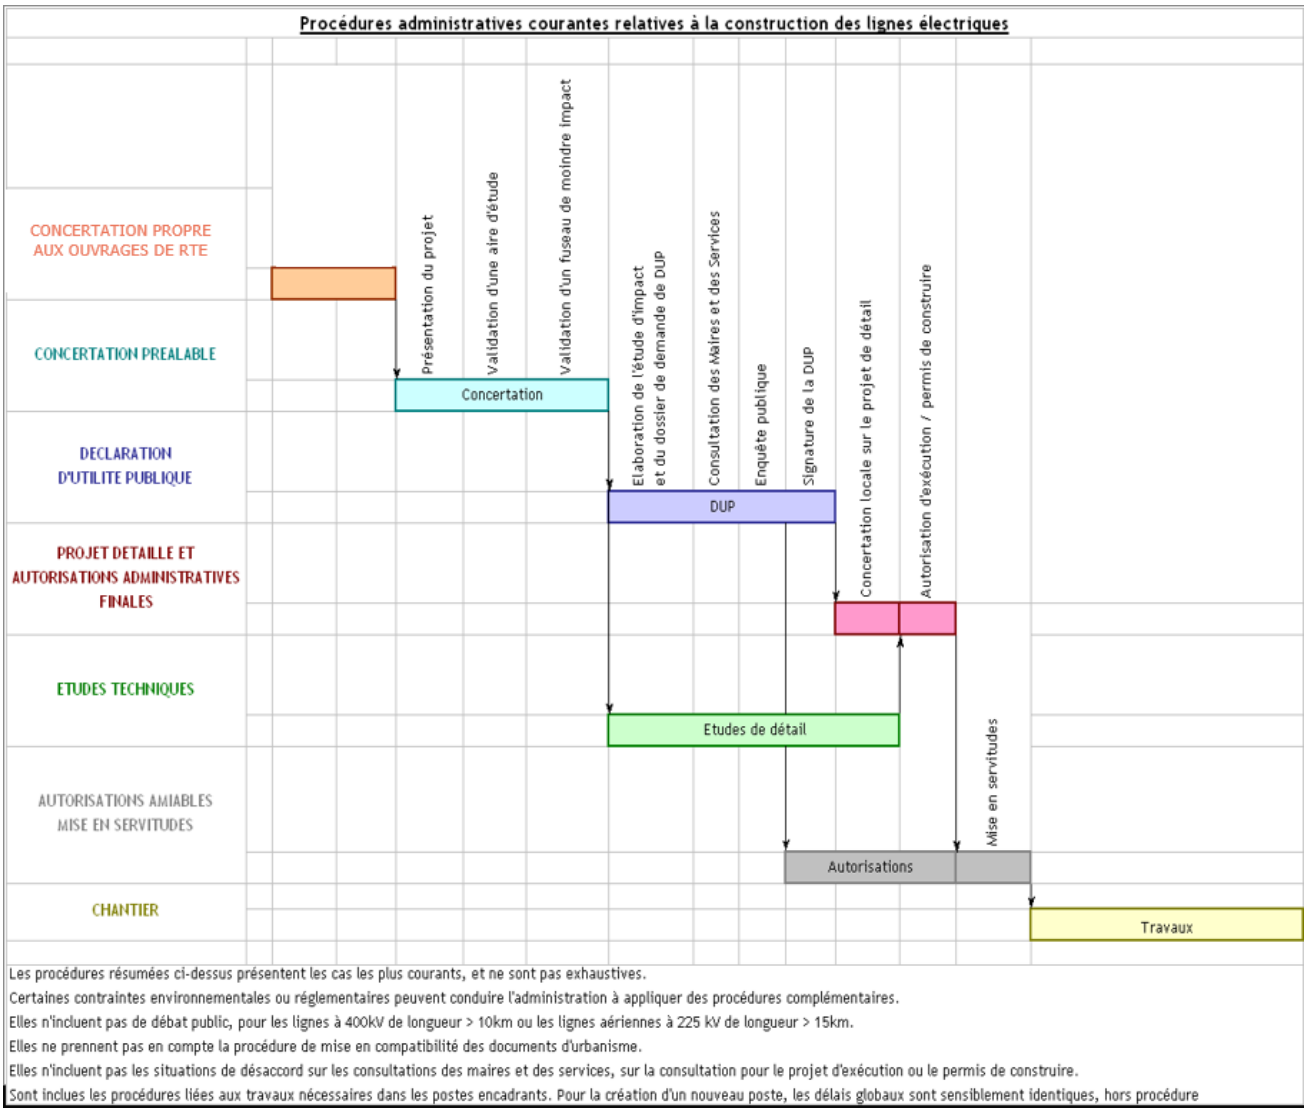

FIN DU DOCUMENT
